Observaciones: La Casa del alumno tiene dos cubiertas. Una cubierta superior en forma de "L" donde están los equipos de climatización a la que se accede por medio de una escalera de tramex cerrada por una cancela y de acceso restringido. También dispone de una cubierta inferior rectangular situada a menor altura que se accede mediante escala con sistema de protección FABA.

La fachada Sur del edificio dispone de unos aleros en cada planta.

Riesgo de caída a distinto nivel

Cubierta superior:

- Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido: trabajos sobre máquinas, etc.

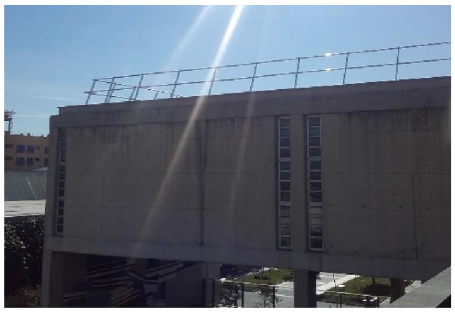

Cubierta situada a menor altura:

- Acceso a la cubierta a través de la escala.

foto

Aleros fachada sur:

- Carecen de protección perimetral.

Riesgo de caída al mismo nivel

Cubierta superior:

- Con materiales depositados en el suelo (bloques, conductos equipos climatización, restos metálicos con aristas cortantes y residuos varios, etc.)

Medidas preventivas existentes:

Cubierta superior:

Todo el perímetro de la cubierta superior está protegido mediante barandilla autoportante.

Cubierta inferior:

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático sobre línea de anclaje rígida para las operaciones de ascenso y descenso en escala (carril Faba). Puerta de acceso clausurada mediante cerradura de seguridad.

Todo el perímetro de la cubierta inferior está protegido mediante barandilla autoportante

Aleros:

Dispositivo retráctil conectado con línea de anclaje flexible horizontal (línea de vida). Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección

Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dichos dispositivos de protección y la barandilla autoportante

Medidas preventivas a adoptar
Únicamente podrán acceder a la cubierta el personal autorizado que disponga de los medios de protección necesarios. Respetar la señalización existente. Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción[1] para trabajo en las cubiertas del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo

[1] Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).
